


43/2011

0787

01 LIP 2011

wk

Opatowiec, dn. 30.06.2011 r.

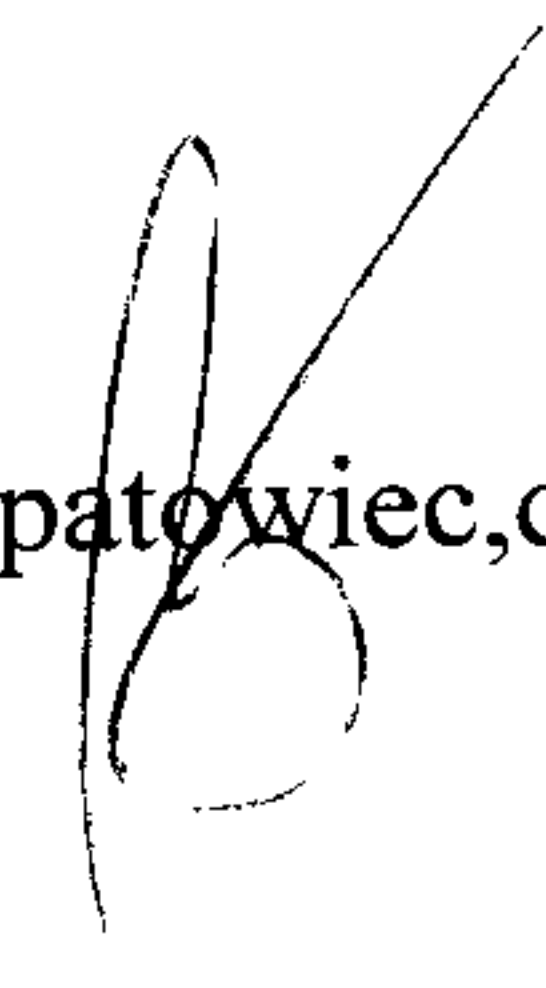


Znak:BI.6921.11.2011

**Pan Henryk Rzepa**  
**Prezes**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Kielcach**  
**ul. Targowa 18**  
**25-520 Kielce**

Urząd Gminy w Opatowcu zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów w Gminie Opatowiec*” o okres wstrzymania prac na budowie w związku z wypadkiem w którym śmierć poniósł pracownik.

Przerwa w pracach trwała od 19 kwietnia 2011 kiedy to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 19.04.2011r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych aż do dnia 16.05.2011r. Postępowanie w powyżej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę w Pińczowie.

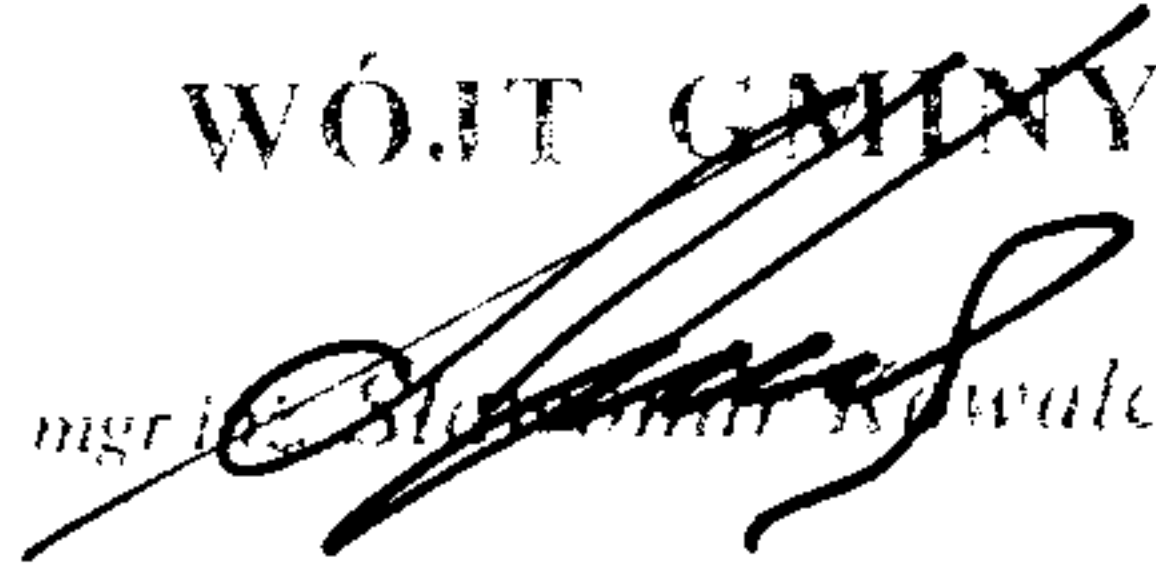WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Kowalczyk

299/2011  
Opr.
